

ENTIDAD		PUEBLA								REPORTE MENSUAL				31-oct-20				
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRAMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		FACTURA		FACTURA	
													NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS		
PLSSA000414	CENTRO DE SALUD URBANO ATLIXCO	ATLIXCO/ATLIXCO	SSEP-DOOBSPGG-LPN-001/2019	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO ATLIXCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA No. 05 HUEJOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	URCOAHM, S.A. DE C.V.	\$ 8,945,713.78	\$ 2,683,714.13	10-sep-20	08-nov-20	-	-		30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	1175	\$ 2,683,714.13
										14.46%	14.46%	14.25%	0.00%	-	-	\$ -	-	\$ -
										60.29%	60.29%	50.53%	1.23%	1	-	\$ -	1177	\$ 110,276.13
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:									74.75%	74.75%	64.78%	1.23%						
													IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$	8,835,437.65		

REPORTE FOTOGRÁFICO



Fotografía 1



Fotografía 3



Fotografía 6



Fotografía 4



Fotografía 7



Fotografía 2



Fotografía 5

TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO.

- Fotografía 1: Suministro y colocación de cubierta metálica con panel tipo multi - techo en acceso principal y aplanados de mezcla en muros.
- Fotografía 2: Suministro y colocación de piso cerámico.
- Fotografía 3: Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros exteriores.
- Fotografía 4: Suministro y colocación de cancelería a base de perfiles de aluminio anodizado natural y cristal claro de 6 mm.
- Fotografía 5: Suministro y colocación de falsos plafones de paneles de yeso comprimido y luminarias de empotrar de panel tipo led.
- Fotografía 6: Fabricación de planchas de concreto armado de F'c= 200 kg/cm2 y malla electrosoldada 6x6x10x10, para recibir ovalines de sobreponer y/o tarjas de acero inoxidable.
- Fotografía 7: Suministro y colocación de cubierta metálica con panel tipo multi - techo en pasillo de comunicación hacia patio de servicio posterior.

NOTA:
 En caso de contratar varias acciones en un solo contrato, deberá indicarse los avances físico-financieros de cada acción, así como señalar el avance físico-financiero por contrato.

ENTIDAD		PUEBLA								REPORTE MENSUAL				31-oct-20				
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRAMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS
PLSSA014753	OFICINA JURISDICCIONAL No.7 (IZÚCAR DE MATAMOROS).	IZÚCAR DE MATAMOROS/IZÚCAR DE MATAMOROS	SSEP-DOOBSPGP-LPN-004/2020	REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No.7 (IZÚCAR DE MATAMOROS), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA No.07, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	GÓMEZ VELASCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,880,008.72	\$ 864,002.62	10-sep-20	24-oct-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	-	-	\$ -	187	\$ 864,002.62
										26.15%	26.15%	27.23%	0.00%	-	-	\$ -	-	\$ -
										73.85%	73.85%	72.77%	14.55%	1 y 1 "A"	-	\$ -	192 193	\$ 419,008.92
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										100.00%	100.00%	100.00%	14.55%					
												IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$	2,460,999.80			

REPORTE FOTOGRÁFICO



Fotografía 1



Fotografía 2



Fotografía 3




Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6

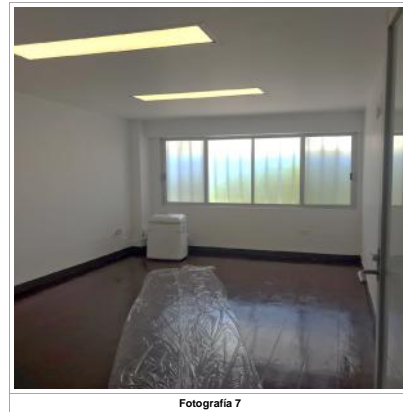

Fotografía 7

TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO.

Fotografía 1: Rehabilitación de fachada principal, con repellado y aplanado de mezcla en muros, suministro y colocación de ventanas y puertas a base de perfiles de aluminio anodizado y cristal claro de 6 mm., mantenimiento y colocación de protecciones metálicas de herrería, rotulación de nombre nominativo de las oficinas y suministro y colocación de logotipos institucionales.

Fotografía 2: Suministro y colocación de cubierta de multi-panel.

Fotografía 3: Fabricación de muros falsos "antepechos" y plafones a base de paneles de yeso comprimido, suministro y aplicación de pintura vinilica, zoclo vinílico.

Fotografía 4: Suministro y colocación de gabinete cerrado 9UR para voz y datos, puertas a base de perfiles de aluminio anodizado natural y cristal de claro de 6 mm., con película autoadherible acabado esmerilado.

Fotografía 5: Rehabilitación de puertas de madera con la sustitución de marcos, triplay, herrajes, chapa y barnizado con acabado en color caoba y suministro y colocación de señalética indicativa.

Fotografía 6: Suministro y colocación de luminarias de empotrar de panel tipo led, equipo de aire acondicionado tipo minisplit y piso y zoclo cerámico.

Fotografía 7: Rehabilitación de piso de madera, suministro y colocación de falsos plafones, luminarias, cancelerías a base de perfiles de aluminio anodizado natural y cristal claro de 6 mm, zoclo vinílico, instalación de equipos de aire acondicionado y aplicación de pintura vinilica.

NOTA: Trabajos de rehabilitación concluidos, en proceso de cierre finiquito y cierre administrativo del contrato.

NOTA:
 En caso de contratar varias acciones en un solo contrato, deberá indicarse los avances físicos-financieros de cada acción, así como señalar el avance físico-financiero por contrato.

ENTIDAD			PUEBLA						REPORTE MENSUAL				31-oct-20					
CLAVES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRAMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		FACTURA		FACTURA	
															NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS
PLSSA014765	OFICINA JURISDICCIONAL No.8 (ACATLÁN DE OSORIO).	ACATLÁN/ACATLÁN DE OSORIO	SSEP-DOOBSPG-LPN-005/2020	REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No. 8 (ACATLÁN DE OSORIO), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 08, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	FERGUSAN, S.A. DE C.V.	\$ 2,887,843.33	\$ 866,353.00	10-sep-20	24-oct-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	352	\$ 866,353.00
										20.06%	20.06%	12.00%	0.00%	-	-	\$ -	-	\$ -
										79.94%	79.94%	63.00%	5.24%	1 y 1 "A"	-	\$ -	368 369	\$ 151,402.93
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:									100.00%	100.00%	75.00%	5.24%						
											IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$ 2,736,440.40					

REPORTE FOTOGRÁFICO



Fotografía 1



Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6



Fotografía 7

TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO.

- Fotografía 1: Fabricación de andador de concreto simple F'c= 150 kg/cm2 y guarniciones en acceso principal.
- Fotografía 2: Suministro y aplicación de pintura en muros exteriores.
- Fotografía 3: Suministro y colocación de falsos plafones de paneles de yeso comprimido.
- Fotografía 4: Fabricación de muros falsos divisorios a base de paneles de yeso comprimido.
- Fotografía 5: Suministro y colocación de muebles sanitarios, azulejo en muros y colocación de falso plafon de tabla - cemento.
- Fotografía 6: Rehabilitación de piso de madera a base de tratamiento antipollita, cepillado y renivelado, así como cambio de piezas deterioradas.
- Fotografía 7: Canalización de instalación eléctrica sobre plafones y habilitado de muros divisorios a base de paneles de yeso.

NOTA:
 En caso de contratar varias acciones en un solo contrato, deberá indicarse los avances físico-financieros de cada acción, así como señalar el avance físico-financiero por contrato.

ENTIDAD			PUEBLA							REPORTE MENSUAL				31-oct-20				
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO							AVANCE				ESTIMACIONES				
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRAMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		FACTURA		FACTURA	
													NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS		
PLSSA005215	CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC	ZINACATEPEC/SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC	SSEP-DOOBSPG-LPN-003/2020	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA No. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	VIO INGENIERÍA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$ 3,569,353.70	\$ 1,070,806.11	10-sep-20	24-oct-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	51	\$ 1,070,806.11
										32.55%	32.55%	11.91%	0.00%	-	-	\$ -	-	\$ -
										67.45%	67.45%	86.59%	5.65%	1 y 1 "A"	-	\$ -	54 55	\$ 201,588.89
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										100.00%	100.00%	98.50%	5.65%					
															IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$	3,367,764.81

REPORTE FOTOGRÁFICO



Fotografía 1



Fotografía 2




Fotografía 3



Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6



Fotografía 7

TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO.

Fotografía 1: Suministro y colocación de cubierta metálica con panel tipo multi - techo en acceso principal.

Fotografía 2: Suministro y colocación de protecciones metálicas de herrería, aplicación de pintura vinílica y rotulación de logotipos institucionales.

Fotografía 3: Suministro y sembrado de plantas ornato en exteriores.

Fotografía 4: Suministro y colocación de lambrin ceramico, mobiliario sanitario y accesorios, puertas de madera y canceles de baño.

Fotografía 5: Suministro y colocación de equipos de aire acondicionado tipo minisplit y de luminarias de empotrar de panel tipo led.

Fotografía 6: Suministro y colocación de señalamientos indicativos de los espacios.

Fotografía 7: Suministro y colocación de closets de madera en residencias médicas.

NOTA:
 En caso de contratar varias acciones en un solo contrato, deberá indicarse los avances físicos-financieros de cada acción, así como señalar el avance físico-financiero por contrato.
