

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020
Reporte de avance físico financiero de acciones
 Puebla, Pue., 31 de diciembre de 2020



Secretaría de Salud
 Gobierno de Puebla



Reconstruyendo Esperanza
 PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA										REPORTE MENSUAL				31-dic-20		
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO/LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRAMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		FACTURA		FACTURA	
															NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS
PLSSA000414	CENTRO DE SALUD URBANO ATLIXCO	ATLIXCO ATLIXCO	SSEP-D00B-SGG-LPN-0012019	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO ATLIXCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA No. 05 HUEJOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	URCOAHM, S.A. DE C.V.	\$ 2,065,714.78	\$ 2,065,714.78	10 sep-20	08 nov-20	-	-	30% DE ANTIPO	ANTECIPO	-	\$ -	1175	\$ 2,062,714.13	
										14.48%	14.46%	14.25%	0.00%	-	\$ -	-	\$ -	
										60.29%	60.29%	60.53%	1.23%	1	\$ -	1177	\$ 118,276.13	
										25.29%	25.25%	25.22%	21.38%	2, 1 "A", 3 y 2 "A"	\$ -	1178, 1182, 1184 y 1182	\$ 1,912,348.58	
										-	-	10.00%	77.38%	4, 3 "A", 5 y 1 E FINQUITO.	\$ -	1185, 1186, 1193 y 1196	\$ 6,922,489.13	
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:									100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	IMPORTE PENDIENTE DE PAGO (REINTEGRO):				\$ 0.02	

REPORTE FOTOGRAFICO

TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO:



Fotografía 1



Fotografía 3



Fotografía 4



Fotografía 6



Fotografía 7



Fotografía 2



Fotografía 5



Fotografía 1: Obra concluida, fachadas.

Fotografía 2: Obra concluida, sala de espera.

Fotografía 3: Obra concluida, archivo clínico.

Fotografía 4: Obra concluida, consultorio dental.

Fotografía 5: Obra concluida, núcleos sanitarios pacientes.

Fotografía 6: Obra concluida, consultorio fisioterapia.

Fotografía 7: Obra concluida, escaleras de acceso a primer piso, área de auscultación para lavado de manos de médicos en consultorios y pasillos de circulación interior.

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

Reporte de avance físico financiero de acciones

Puebla, Pue., 31 de diciembre de 2020



Secretaría de Salud
Gobierno de Puebla



Reconstruyendo
Esperanza
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD			PUEBLA							REPORTE MENSUAL				31 dic-20					
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO/LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO					AVANCE				ESTIMACIONES							
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRÁMITE		PAGADAS		
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS	
PLSSA005215	CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC	ZINACATEPEC/SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC	SSEP-DOOB-SQPG-LPN-0032020	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ZINACAT EPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ZINACAT EPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA No. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	VIO INGENIERÍA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$ 3,569,303.70	\$ 1,878,886.11	10 sep-20	24 oct-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	51	\$ 1,878,886.11	
										32.55%	32.55%	11.91%	0.00%	-	-	-	\$ -	-	\$ -
										67.49%	67.49%	86.50%	5.60%	1 y 1 "A"	-	\$ -	54 y 55	\$ 201,588.89	
										8.80%	8.80%	1.56%	52.21%	2 y 2 "A"	-	\$ -	58 y 57	\$ 1,863,091.62	
										-	-	-	41.42%	3, 3 "A" y 1 E FINQUITO	-	\$ -	67, 68 y 66	\$ 1,478,324.64	
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										100.00%	100.00%	100.00%	99.29%						
												IMPORTE PENDIENTE DE PAGO (REINTEGRO):		\$	25,828.55				

REPORTE FOTOGRAFICO

TRABAJO EJECUTADO AL PERIODO:



Fotografía 1



Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6



Fotografía 7

- Fotografía 1: Obra concluida, fachadas.
- Fotografía 2: Obra concluida, losas de azotea.
- Fotografía 3: Obra concluida, vestíbulo de acceso y sala de espera consulta externa.
- Fotografía 4: Obra concluida, consultorios.
- Fotografía 5: Obra concluida, farmacia y medicina preventiva.
- Fotografía 6: Obra concluida, esterilización y residencias médicas.
- Fotografía 7: Obra concluida, consultorio dental.

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

Reporte de avance físico financiero de acciones

Puebla, Pue., 31 de diciembre de 2020



Secretaría de Salud
Gobierno de Puebla



Reconstruyendo
Esperanza
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA										REPORTE MENSUAL				31-dic-20			
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES						
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRAMITE		PAGADAS		
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS	
PLSSA014753	OFICINA JURISDICCIONAL No.7 (IZÚCAR DE MATAMOROS).	IZÚCAR DE MATAMOROS/IZÚCAR DE MATAMOROS	SSEP-0008 S0PG-LPN-0042020	REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No.7 (IZÚCAR DE MATAMOROS), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE MATAMOROS, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA No.7, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	GÓMEZ VELASCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,889,868.72	\$ 864,862.52	10-sep-20	24-oct-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	-	-	\$ -	187	\$ 864,862.52	
										26.19%	26.19%	27.23%	8.88%	-	-	\$ -	-	\$ -	
										73.85%	73.85%	72.77%	14.35%	1 y 1 "A"	-	\$ -	192 y 193	\$ 419,988.92	
										8.88%	8.88%	8.88%	51.88%	2 y 2 "A"	-	\$ -	208 y 202	\$ 1,486,886.35	
										-	-	-	32.29%	1 E PINKQUITO	-	\$ -	205	\$ 928,872.66	
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:												100.00%	100.00%	100.00%	58.44%				
													IMPORTE PENDIENTE DE PAGO (REINTEGRO):		\$	45,848.79			

REPORTE FOTOGRAFICO



Fotografía 1




Fotografía 3



Fotografía 6



Fotografía 4

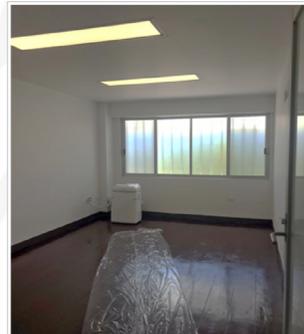

Fotografía 7



Fotografía 2



Fotografía 5

TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO:

- Fotografía 1: Obra concluida, fachada principal.
- Fotografía 2: Obra concluida, bodega y/o almacén.
- Fotografía 3: Obra concluida, planta alta oficinas operativos.
- Fotografía 4: Obra concluida, vestíbulo principal.
- Fotografía 5: Obra concluida, planta baja, y vestíbulo sanitarios.
- Fotografía 6: Obra concluida, planta baja oficinas operativos.
- Fotografía 7: Obra concluida, planta alta oficinas operativos.

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020
Reporte de avance físico financiero de acciones
 Puebla, Pue., 31 de diciembre de 2020



ENTIDAD		PUEBLA								REPORTE MENSUAL				31-dic-20				
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRAMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS
PLSSA014765	OFICINA JURISDICCIONAL No 8 (ACATLÁN DE OSORIO)	ACATLÁN/ACATLÁN DE OSORIO	SEP-D00B SGPGLPN-0052020	REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No. 8 (ACATLÁN DE OSORIO), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 08, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	FERGUSON, S.A. DE C.V.	\$ 2,887,843.33	\$ 866,252.00	19-sep-20	24-oct-20	-	-	-	36% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	352	\$ 866,252.00
										26.85%	26.85%	12.88%	8.88%	-	-	\$ -	-	\$ -
										73.94%	73.94%	63.88%	5.24%	1 y 1 "A"	-	\$ -	368 y 240	\$ 1,91,482.93
										8.88%	8.88%	22.88%	68.88%	2, 2 "B" y 3	-	\$ -	377, 378 y 381	\$ 1,734,195.91
										-	-	3.88%	34.71%	3 "R" y 1 E FINQUITO	-	\$ -	382 y 400	\$ 1,002,283.28
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:									100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	IMPORTE PENDIENTE DE PAGO (REINTEGRO):				\$ 0.21	

REPORTE FOTOGRÁFICO



Fotografía 1



Fotografía 3



Fotografía 6



Fotografía 4



Fotografía 7



Fotografía 2



Fotografía 5

TRABAJO EJECUTADO AL PERIODO:

- Fotografía 1: Obra concluida, fachada principal.
- Fotografía 2: Obra concluida, planta baja oficinas operativos.
- Fotografía 3: Obra concluida, planta baja oficinas operativos.
- Fotografía 4: Obra concluida, núcleos sanitarios.
- Fotografía 5: Obra concluida, planta alta oficinas operativos.
- Fotografía 6: Obra concluida, planta alta oficinas operativos.
- Fotografía 7: Obra concluida, vestíbulo de acceso a planta alta.

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

Reporte de avance físico financiero de acciones

Puebla, Pue., 31 de diciembre de 2020



Secretaría de Salud
Gobierno de Puebla



Reconstruyendo
Esperanza
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA								REPORTE MENSUAL				31-dic-20				
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRAMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS
PLSSA003972	CENTRO DE SALUD HUAJOYUCA	TEPEXI DE RODRIGUEZHUAJOYUCA	SSEP-DOOB-SGPG-ADF-0032020	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD HUAJOYUCA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAJOYUCA DE PALACIOS, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 03, TEPEXI DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	TERRENIUM, S.A. DE C.V.	\$ 1,148,787.83	\$ 344,636.11	12-sep-20	26-dic-20	-	-	-	30% DE ANTIPO	ANTIPO	-	\$ -	-	\$ -
										15.50%	15.50%	25.32%	0.00%	-	-	\$ -	-	\$ -
										84.50%	84.50%	74.68%	99.97%	1,174 y 1 EFIRMADO	-	\$ -	27, 28 y 29	\$ 1,143,624.22
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										100.00%	100.00%	100.00%	99.97%					
												IMPORTE PENDIENTE DE PAGO (REINTEGRO):				\$ 4,362.81		

REPORTE FOTOGRÁFICO



Fotografía 1



Fotografía 3



Fotografía 6



Fotografía 4



Fotografía 7



Fotografía 2



Fotografía 5

TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO:

- Fotografía 1: Obra concluida, fachada principal.
- Fotografía 2: Obra concluida, fachada posterior y lateral.
- Fotografía 3: Obra concluida, sala de espera.
- Fotografía 4: Obra concluida, pasillo de circulación interior.
- Fotografía 5: Obra concluida, área de consultorio médico.
- Fotografía 6: Obra concluida, área de C.E. y E.
- Fotografía 7: Obra concluida, área de farmacia.

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020
Reporte de avance físico financiero de acciones
 Puebla, Pue., 31 de diciembre de 2020



ENTIDAD		PUEBLA								REPORTE MENSUAL				31-dic-20				
CLU E S	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRAMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS
PLSSA001295	CENTRO DE SALUD XONOTIPAN DE JUÁREZ	ELOXOCHITLÁN/XONOTIPAN DE JUÁREZ	SSEP-DO06 SGP-ADF-009/2020	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD XONOTIPAN DE JUÁREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XONOTIPAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	GRUPO CONSTRUCTOR SANBZA, S.A. DE C.V.	\$ 1,532,795.91	\$ 316,115.00	17-ene-20	31-dic-20	-	-	-	30% DE ANTIPO	ANTIPO	-	\$ -	-	\$ -
										31.1%	31.1%	35.0%	0.0%	-	-	-	-	
										63.8%	63.8%	65.0%	38.1%	1,178 y 2180000	-	\$ -	72,73 y 77	\$ 1,532,795.91
										-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										100.0%	100.0%	100.0%	38.1%					
												IMPORTE PENDIENTE DE PAGO (REINTEGRO):		\$ 28,961.93				

REPORTE FOTOGRÁFICO



Fotografía 1



Fotografía 3



Fotografía 6



Fotografía 4



Fotografía 7



Fotografía 2



Fotografía 5

TRABAJO S EJECUTADOS AL PERIODO:

- Fotografía 1: Obra concluida, fachada principal.
- Fotografía 2 y 3: Obra concluida, área de encamados.
- Fotografía 4: Obra concluida, área de auscultación para lavado de manos de médicos en consultorios.
- Fotografía 5: Obra concluida, área para lavado de instrumental médico.
- Fotografía 6: Obra concluida, área de cocina.
- Fotografía 7: Obra concluida, pasillos de circulación interior.

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

Reporte de avance físico financiero de acciones

Puebla, Pue., 31 de diciembre de 2020



Secretaría de Salud
Gobierno de Puebla



Reconstruyendo
Esperanza
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA								REPORTE MENSUAL				31 dic-20				
CLAVES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO					AVANCE				ESTIMACIONES						
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRÁMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DECUENTOS
PLSSA001411	ESTABLECIMIENTO DE APOYO LABORATORIO (UNIDAD DE BIEN SAYO)	HUAQUECHULACACALOXUCHIL	SEP-DO0BSOPG-ADF-0102020	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE APOYO LABORATORIO (UNIDAD DE BIEN SAYO), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHIL, MUNICIPIO DE HUALA ESCOBAR, JURISDICCIÓN SANITARIA N.º 05 HUEJOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	JOSE LUIS CASAS VALDEZ	\$ 274,528.00	\$ -	12 nov-20	26 dic-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	-	\$ -
										42.22%	42.22%	48.00%	8.00%	-	-	\$ -	-	\$ -
										57.78%	57.78%	68.00%	100.00%	1 y 2 FINICRITO	-	\$ -	7943 y 7975	\$ 274,528.00
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:									100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:				\$ -	

REPORTE FOTOGRÁFICO						
			TRABAJO EJECUTADOS AL PERIODO:			
Fotografía 1	Fotografía 3	Fotografía 6	Fotografía 1 y 2: Maqueta. Fotografía 3 a 6: Imágenes digitales (Render).			
						
Fotografía 2	Fotografía 4	Fotografía 7				

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

Reporte de avance físico financiero de acciones

Puebla, Pue., 31 de diciembre de 2020



Secretaría de Salud
Gobierno de Puebla



Reconstruyendo
Esperanza
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA										REPORTE MENSUAL				31 dic-20		
CLAVES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO							AVANCE				ESTIMACIONES				
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTECIPIO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRÁMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS
PLSSA005886	CENTRO DE SALUD HUEHUETLÁN EL CHICO	HUEHUETLÁN EL CHICO HUEHUETLÁN EL CHICO	SSEP-DOOB-SGPG-ADF-0112/20	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD HUEHUETLÁN EL CHICO, DE DOS NÚCLEOS BÁSICOS + 1 DENTAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLÁN EL CHICO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO, JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 07 IZUICAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	PANECO DESARROLLOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V.	\$ 583,543.88	\$ -	12-ene-20	26-dic-20	-	-	-	38% DE ANTECIPIO	ANTICIPO	-	\$ -	-	\$ -
										42.22%	42.22%	48.89%	8.89%	-	-	\$ -	-	\$ -
										57.78%	57.78%	68.89%	100.00%	1 y 2 FIBRADO	-	\$ -	117 y 118	\$ 583,543.88
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:									100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
													IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$ -	-		

REPORTE FOTOGRÁFICO



Fotografía 1



Fotografía 3



Fotografía 6



Fotografía 4



Fotografía 7



Fotografía 5



Fotografía 2

TRABAJO EJECUTADO AL PERIODO:

Fotografía 1 y 2: Maqueta.

Fotografía 3 a la 7: Imágenes digitales (Render)

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

Reporte de avance físico financiero de acciones

Puebla, Pue., 31 de diciembre de 2020



ENTIDAD		PUEBLA								REPORTE MENSUAL				31-dic-20				
CLAVES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRÁMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS
PLSSA014741	OFICINA JURISDICCIONAL No. 6 (PUEBLA)	PUEBLA/HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	SSEP-DO08SGPG-ADF-012/2020	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL NO. 6 (PUEBLA), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, JURISDICCION SANFARVA NO. 96 PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA*	JOSÉ DE JESÚS ROBLES SÁNCHEZ	\$ 632,157.68	\$ -	12-ene-20	26-dic-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	-	\$ -
										42.22%	42.22%	48.88%	8.88%	-	\$ -	-	\$ -	
										57.78%	57.78%	68.88%	100.00%	1 y 2 FIRMADO	-	\$ -	2,085 y 2,414	\$ 632,157.68
										-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	
										-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:				\$ -

REPORTE FOTOGRAFICO



Fotografía 1



Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6



Fotografía 7



Fotografía 7

TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO:

Fotografía 1 y 2: Maqueta.

Fotografía 3 a la 7: Imágenes digitales (Render)
