

# PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

## Reporte de avance físico-financiero de acciones

Puebla, Pue., 30 de noviembre de 2020



**GOBIERNO DE MÉXICO**



Secretaría de Salud  
Gobierno de Puebla



Reconstruyendo **Esperanza**  
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA								REPORTE MENSUAL				30-nov-20				
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRÁMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS
PLSSA003972	CENTRO DE SALUD HUAJOYUCA	TEPEXI DE RODRIGUEZ/HUAJOYUCA	SSEP-DO08SGPG-ADF-009/2020	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD HUAJOYUCA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAJOYUCA (HUAJOYUCA DE PALACIOS), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 09, TEPEXI DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	TERRENIUM, S.A. DE C.V.	\$ 1,148,787.03	\$ 344,636.11	12-nov-20	26-dic-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	-	\$ -
										15.50%	15.50%	25.32%	0.00%	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:									15.50%	15.50%	25.32%	0.00%						
												IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$ 1,148,787.03				

### REPORTE FOTOGRÁFICO



Fotografía 1



Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6



Fotografía 7

#### TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO

- Fotografía 1: Tratamiento de fisuras, restitución de aplanados de mezcla y aplicación de pintura vinílica lavable en muros de fachadas.
- Fotografía 2: Sustitución de capa impermeable prefabricada de 4mm (App) en losas de azotea.
- Fotografía 3: Restitución de banquetas perimetrales exteriores.
- Fotografía 4: Suministro y colocación de recubrimiento cerámico en piso al interior de la unidad.
- Fotografía 5: Restitución de aplanados de mezcla en muros interiores de la unidad.
- Fotografía 6 y 7: Restitución de aplanados de mezcla en plafones con la colocación de malla metálica.

# PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

## Reporte de avance físico-financiero de acciones

Puebla, Pue., 30 de noviembre de 2020



**GOBIERNO DE MÉXICO**



Secretaría de Salud  
Gobierno de Puebla



Reconstruyendo  
**Esperanza**  
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA								REPORTE MENSUAL				30-nov-20				
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO					AVANCE				ESTIMACIONES						
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRÁMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		FACTURA		FACTURA	
													NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS		
PLSSA001295	CENTRO DE SALUD XONOTIPAN DE JUÁREZ	ELOXOCHTLÁN/XONOTIPAN DE JUÁREZ	SSEP-DO08SGPG-ADF-008/2020	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD XONOTIPAN DE JUÁREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XONOTIPAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ELOXOCHTLÁN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	GRUPO CONSTRUCTOR SANBZA, S.A. DE C.V.	\$ 1,153,716.94	\$ 346,115.08	17-nov-20	31-dic-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	-	\$ -
										31.11%	31.11%	35.00%	0.00%	-	\$ -	-	\$ -	
										-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	
										-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	
										-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:									31.11%	31.11%	35.00%	0.00%						
											IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$	1,153,716.94				

### REPORTE FOTOGRÁFICO



Fotografía 1



Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6



Fotografía 7



Fotografía 7

#### TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO

- Fotografía 1 y 2: Retiro de capa impermeable de deteriorada en losas de azotea.
- Fotografía 3: Demolición de recubrimiento cerámico en mesetas y desmantelamiento de muebles de madera.
- Fotografía 4 y 5: Demolición de recubrimiento cerámico en pisos.
- Fotografía 6: Restitución de aplanados de mezcla en muros interiores.
- Fotografía 7: Desmantelamiento de persianas de PVC y mobiliario - accesorios sanitarios.

# PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

## Reporte de avance físico-financiero de acciones

Puebla, Pue., 30 de noviembre de 2020



**GOBIERNO DE MÉXICO**



Secretaría de Salud  
Gobierno de Puebla



Reconstruyendo **Esperanza**  
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA								REPORTE MENSUAL				30-nov-20					
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES						
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRAMITE		PAGADAS		
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		FACTURA		FACTURA		
															NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS	
PLSSA005215	CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC	ZINACATEPEC/SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC	SSEP-DO0BSGPG-LPN-003/2020	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, PERTENECIENE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA No. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	VIO INGENIERÍA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$ 3,569,353.70	\$ 1,070,806.11	10-sep-20	24-oct-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	51	\$ 1,070,806.11	
										32.55%	32.55%	11.91%	0.00%	-	-	-	\$ -		
										67.45%	67.45%	86.59%	5.65%	1 y 1 'A'	-	-	\$ -	54 y 55	\$ 201,588.89
										0.00%	0.00%	1.50%	52.21%	2 y 2 'A'	-	-	\$ -	58 y 57	\$ 1,863,601.62
										-	-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:									100.00%	100.00%	100.00%	57.86%							
												IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$ 1,504,163.19					

REPORTE FOTOGRÁFICO							TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO	
							<p>Fotografía 1: Obra concluida, fachadas.                      Fotografía 2: Obra concluida, losas de azotea.                      Fotografía 3: Obra concluida, vestíbulo de acceso y sala de espera consulta externa.                      Fotografía 4: Obra concluida, consultorios.                      Fotografía 5: Obra concluida, farmacia y medicina preventiva.                      Fotografía 6: Obra concluida, esterilización y residencias médicas.                      Fotografía 7: Obra concluida, consultorio dental.</p> <p>NOTA: Trabajos de rehabilitación concluidos, en proceso de finiquito y cierre administrativo del contrato.</p>	

# PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

## Reporte de avance físico-financiero de acciones

Puebla, Pue., 30 de noviembre de 2020



**GOBIERNO DE MÉXICO**



Secretaría de Salud  
Gobierno de Puebla



Reconstruyendo  
**Esperanza**  
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA								REPORTE MENSUAL				30-nov-20				
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	ENTRANTE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS
PLSSA000414	CENTRO DE SALUD URBANO ATLIXCO	ATLIXCO/ATLIXCO	SSEP-DO0BSGPG-LPN-001/2019	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO ATLIXCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA No. 05 HUEJOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	URCOAHM, S.A. DE C.V.	\$ 8,945,713.78	\$ 2,683,714.13	10-sep-20	08-nov-20	-	-	30% DE ANTICIPO		ANTICIPO	-	\$ -	1175	\$ 2,683,714.13
										14.46%	14.46%	14.25%	0.00%	-	-	\$ -	-	\$ -
										60.29%	60.29%	50.53%	1.23%	1	-	\$ -	1177	\$ 110,276.13
										25.25%	25.25%	25.22%	21.38%	2, 1 'A', 3 y 2 'A'	-	\$ -	1178, 1183, 1184 y 1182	\$ 1,912,948.60
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										100.00%	100.00%	90.00%	22.62%					
												IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$ 6,922,489.05				

REPORTE FOTOGRÁFICO						
			TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO			
Fotografía 1	Fotografía 3	Fotografía 6	Fotografía 1: Fabricación y colocación de estructura metálica en fachada principal, suministro y colocación de reja-acero en barda perimetral y suministro y aplicación de pintura vinílica lavable en muros.			
			Fotografía 2: Fabricación y colocación de cancelería a base de perfiles de aluminio en fachadas posteriores.			
Fotografía 2	Fotografía 4	Fotografía 7	Fotografía 3 y 4: Suministro y colocación de recubrimiento cerámico en piso y zócalo, así como la aplicación de pintura vinílica en muros.			
			Fotografía 5: Suministro y colocación de puertas de madera de intercomunicación.			
	Fotografía 5		Fotografía 6 y 7: Forjado de mesetas de concreto armado y forrado de las mismas en recubrimiento cerámico.			

# PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

## Reporte de avance físico-financiero de acciones

Puebla, Pue., 30 de noviembre de 2020



**GOBIERNO DE MÉXICO**



Secretaría de Salud  
Gobierno de Puebla



Reconstruyendo  
**Esperanza**  
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA										REPORTE MENSUAL				30-nov-20		
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRAMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		FACTURA		FACTURA	
															NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS
PLSSA014753	OFICINA JURISDICCIONAL No.7 (IZÚCAR DE MATAMOROS).	IZÚCAR DE MATAMOROS	SSEP-000BSP6-LPN-0042020	REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No.7 (IZÚCAR DE MATAMOROS). UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS. MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS. PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA No.7, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	GÓMEZ VELASCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,880,008.72	\$ 864,002.62	10-sep-20	24-oct-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	-	-	\$ -	187	\$ 864,002.62
										26.15%	26.15%	27.23%	0.00%	-	-	\$ -	-	\$ -
										73.85%	73.85%	72.77%	14.55%	1 y 1 "A"	-	\$ -	192 y 193	\$ 419,008.92
										0.00%	0.00%	0.00%	51.60%	2 y 2 "A"	-	\$ -	200 y 202	\$ 1,486,086.35
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Porcentaje de Avance Promedio per Contrato:									100.00%	100.00%	100.00%	66.15%						
												IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$	974,913.45			

### REPORTE FOTOGRÁFICO



Fotografía 1




Fotografía 3



Fotografía 6




Fotografía 4

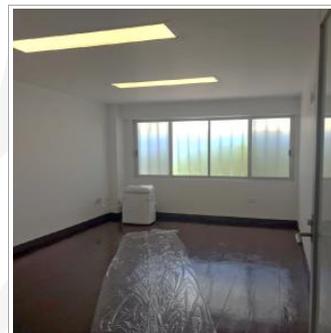

Fotografía 7



Fotografía 2



Fotografía 5

### TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO

- Fotografía 1: Obra concluida, fachada principal.
- Fotografía 2: Obra concluida, bodega y/o almacén.
- Fotografía 3: Obra concluida, planta alta oficinas operativas.
- Fotografía 4: Obra concluida, vestíbulo principal.
- Fotografía 5: Obra concluida, planta baja, vestíbulo sanitarios.
- Fotografía 6: Obra concluida, planta baja oficinas operativas.
- Fotografía 7: Obra concluida, planta alta oficinas operativas.

NOTA: Trabajos de rehabilitación concluidos, en proceso de finiquito y cierre administrativo del contrato.

# PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

## Reporte de avance físico-financiero de acciones

Puebla, Pue., 30 de noviembre de 2020



**GOBIERNO DE MÉXICO**



Secretaría de Salud  
Gobierno de Puebla



Reconstruyendo **Esperanza**  
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA										REPORTE MENSUAL		30-nov-20				
CLAVES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRÁMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		FACTURA		FACTURA	
													NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO		
PLSSA014765	OFICINA JURISDICCIONAL No.8 (ACATLÁN DE OSORIO).	ACATLÁN/ACATLÁN DE OSORIO	SSEP-D008SGPG-LPN-005/2020	REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No. 8 (ACATLÁN DE OSORIO), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO MUNICIPIO DE ACATLÁN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 08, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	FERGUSAN, S.A. DE C.V.	\$ 2,887,843.33	\$ 866,353.00	10-sep-20	24-oct-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	352	\$ 866,353.00
										20.06%	20.06%	12.00%	0.00%	-	\$ -	-	\$ -	
										79.94%	79.94%	63.00%	5.24%	1 y 1'A	-	\$ -	368 y 369	\$ 151,402.93
										0.00%	0.00%	22.00%	60.05%	2, 2 'A' y 3	-	\$ -	377, 378 y 381	\$ 1,734,156.91
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										100.00%	100.00%	97.00%	65.29%					
													IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$	1,002,283.49		

### REPORTE FOTOGRÁFICO



Fotografía 1



Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6



Fotografía 7



Fotografía 7

#### TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO

Fotografía 1: Suministro y colocación de cancelería de aluminio, aplicación de pintura vinílica y rotulación de logotipos y nombre nominativo de las oficinas.

Fotografía 2: Forjado de andador para acceso principal peatonal.

Fotografía 3 y 4: Suministro y aplicación de pintura vinílica lavable en muros y plafones así como la fabricación y colocación de puertas y repisas de madera.

Fotografía 5: Suministro y colocación de muebles y accesorios sanitarios.

Fotografía 6: Suministro y colocación de recubrimiento cerámico en muros de sanitarios.

Fotografía 7: Suministro y colocación de señalamientos.

# PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

## Reporte de avance físico-financiero de acciones

Puebla, Pue., 30 de noviembre de 2020



**GOBIERNO DE MÉXICO**



Secretaría de Salud  
Gobierno de Puebla



Reconstruyendo **Esperanza**  
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA										REPORTE MENSUAL				30-nov-20			
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES						
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRÁMITE		PAGADAS		
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS	
PLSSA001411	ESTABLECIMIENTO DE APOYO LABORATORIO (UNIDAD DE BIENESTAR)	HUAQUECHULA/CACALOXÚCHTL	SSEP-0008SGPG-ADF-010/2020	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE APOYO LABORATORIO (UNIDAD DE BIENESTAR), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CACALOXÚCHTL, MUNICIPIO DE HUADUECHULA, JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 05 HUELOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	JOSÉ LUIS CASAS VALDEZ	\$ 274,630.00	\$ -	12-nov-20	26-dic-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	-	\$ -	
										42.22%	42.22%	40.00%	0.00%	-	-	\$ -	-	\$ -	
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	
										Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:				42.22%	42.22%	40.00%	0.00%		
																IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$ 274,630.00	

# PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

## Reporte de avance físico-financiero de acciones

Puebla, Pue., 30 de noviembre de 2020



**GOBIERNO DE MÉXICO**



Secretaría de Salud  
Gobierno de Puebla



Reconstruyendo  
**Esperanza**  
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD			PUEBLA							REPORTE MENSUAL				30-nov-20				
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO					AVANCE				ESTIMACIONES						
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRAMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		FACTURA		FACTURA	
													NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS		
PLSSA005886	CENTRO DE SALUD HUEHUETLAN EL CHICO	HUEHUETLAN EL CHICO/HUEHUETLAN EL CHICO	SSEP-DO08SGPG-ADF-011/2020	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD HUEHUETLAN EL CHICO, DE DOS NÚCLEOS BÁSICOS + 1 DENTAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLAN EL CHICO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 07 IZUCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	PANECO DESARROLLOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V.	\$ 583,543.80	-	12-nov-20	26-dic-20	-	-	-	30% DE ANTIPO	ANTIPO	-	\$ -	-	\$ -
										42.22%	42.22%	40.00%	0.00%	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										42.22%	42.22%	40.00%	0.00%					
													IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$	583,543.80		

# PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

## Reporte de avance físico-financiero de acciones

Puebla, Pue., 30 de noviembre de 2020



**Gobierno de**  
**MÉXICO**



Secretaría  
de Salud  
Gobierno de Puebla



Reconstruyendo  
**Esperanza**  
PROGRAMA NACIONAL DE  
RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA										REPORTE MENSUAL				30-nov-20		
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRÁMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		FACTURA		FACTURA	
															NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS
PLSSA014741	OFICINA JURISDICCIONAL No. 6 (PUEBLA)	PUEBLA:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	SSEP-DO08SGPG-ADF-012/2020	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL NO. 6 (PUEBLA), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, JURISDICCION SANITARIA NO. 06 PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	JOSÉ DE JESÚS ROBLES SÁNCHEZ	\$ 632,197.68		12-nov-20	26-dic-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	-	\$ -
										42.22%	42.22%	40.00%	0.00%	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										42.22%	42.22%	40.00%	0.00%					
										IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:				\$	632,197.68			
