

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

Reporte de avance físico-financiero de acciones

Puebla, Pue., 30 de noviembre de 2020



GOBIERNO DE
MÉXICO




Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla




Reconstruyendo
Esperanza
PROGRAMA NACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA										REPORTE MENSUAL				30-nov-20		
CLUSES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO								AVANCE				ESTIMACIONES			
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRÁMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		FACTURA		FACTURA	
													NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS		
PLSSA001295	CENTRO DE SALUD XONOTIPAN DE JUÁREZ	ELOXOCHTLÁN/XONOTIPAN DE JUÁREZ	SSEP-00086SGP-AD-0080020	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD XONOTIPAN DE JUÁREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XONOTIPAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ELOXOCHTLÁN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 10, TENUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	GRUPO CONSTRUCTOR SANBIZA, S.A. DE C.V.	\$ 1,153,716.94	\$ 346,115.08	17-nov-20	31-dic-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	-	\$ -
										31.11%	31.11%	35.00%	0.00%	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										31.11%	31.11%	35.00%	0.00%					
													IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$	1,153,716.94		


REPORTE FOTOGRÁFICO




Fotografía 1




Fotografía 2




Fotografía 3




Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6

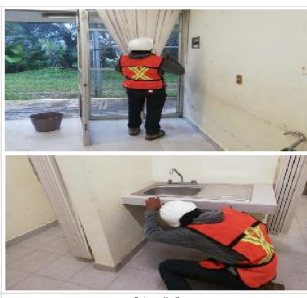

Fotografía 7

TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO

Fotografía 1 y 2: Retiro de capa impermeable de deteriorada en losas de azotea.

Fotografía 3: Demolición de recubrimiento cerámico en mesetas y desmantelamiento de muebles de madera.

Fotografía 4 y 5: Demolición de recubrimiento cerámico en pisos.

Fotografía 6: Restitución de aplanados de mezcla en muros interiores.

Fotografía 7: Desmantelamiento de persianas de PVC y mobiliario - accesorios sanitarios.
